

Créer un livrable

Gestion des livrables

- [Introduction](#)
- [Les niveaux de gestion des livrables](#)
- [Les types de livrables](#)
- **[Créer un livrable](#)**
- [Copier et/ou mettre à jour un livrable](#)
- [Personnaliser ses livrables](#)
- [Gérer les Etats](#)
- [Faire du clipping](#)

Pour créer un livrable :

1. rendez-vous dans l'interface Livrables 

2. cliquez ensuite cliquer sur le bouton  situé en bas du volet gauche

Selon les cas, paramétrez ainsi :

Pour un carnet de phasage

- 1) choisir le sous-projet
- 2) cochez les activités récapitulatives correspondant aux phases du projet considérées
- 3) choisir un fond de plan et un gabarit
- 4) choisir un prototype d'étiquette et spécifiez si besoin la couleur et le style des liens d'étiquettes
- 5) cliquer sur "Ajouter"
- 6) remplacez si besoin le plan utilisé par chaque planche

Création d'un carnet de phasage

Sous-projet

Nom	
Sous-projet par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>

Phases

Nom	
Sous-projet par défaut (P...	<input type="checkbox"/>
Phase 1 : 1/2 Giratoire ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 2 : 1/4 Giratoire E...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 3 : 1/4 Giratoire ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 3b : Aménageme...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 4 : Chaussée Nor...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 5 : Chaussée Sud ...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 6 : Pavane final (R)	<input checked="" type="checkbox"/>

Générer les planches

Début de p... 17/04/2019 8 : 0

Fin de phase 11/12/2020 15 : 0

Multiple 1 JOURS

Fond de plans

Fond de plan Plan final-

Gabarit Gabarit par défaut

Etiquettes Liens

Etiquettes Etiquette par défaut

Couleur Noir

Taille 1 Pointillés

Nom	Début	Fin	Plan
Phase 1 : 1/2 Giratoire Nord	17/04/2019 08:00	11/12/2020 15:00	Plan final-
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est	26/06/2019 08:00	23/07/2019 16:00	Plan final-
Phase 3 : 1/4 Giratoire Ouest	24/07/2019 08:00	06/09/2019 16:00	Plan final-
Phase 3b : Aménagement du TPC	26/08/2019 08:00	30/08/2019 16:00	Plan final-
Phase 4 : Chaussée Nord	20/09/2019 08:00	21/11/2019 15:00	Plan final-
Phase 5 : Chaussée Sud	22/11/2019 08:00	29/01/2020 15:00	Plan final-
Phase 6 : Pavage final	10/02/2020 08:00	21/02/2020 15:00	Plan final-

Remplacer
Ajouter
Supprimer

OK Annuller

- 7) "OK" permet de créer le carnet.

Pour des planches séquentielles

On va par exemple créer un carnet de détail à la semaine de la phase 2 de notre projet.

Commencer par : spécifier le sous-projet, cochez la phase à détailler, puis cliquez sur "Ajouter". Ceci vous permet de visualiser les dates de début et de fin de la phase :

Création d'un carnet de phasage

Sous-projet

Nom	
Sous-projet par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>

Phases

Nom	
Sous-projet par défaut (P...	<input type="checkbox"/>
Phase 1 : 1/2 Giratoire ...	<input type="checkbox"/>
Phase 2 : 1/4 Giratoire E...	<input checked="" type="checkbox"/>
Phase 3 : 1/4 Giratoire ...	<input type="checkbox"/>
Phase 3b : Aménageme...	<input type="checkbox"/>
Phase 4 : Chaussée Nor...	<input type="checkbox"/>
Phase 5 : Chaussée Sud ...	<input type="checkbox"/>

Fond de plans

Début de plan final-

Fin de phase arit par défaut

Multiple

Etiquettes Liens

Etiquette par défaut

Noir


Pointillés

Nom	Début	Fin
Phase 2 : 1/4 Giratoire Est	26/06/2019 08:00	23/07/2019 16:00

Remplacer
Ajouter

Configurez ensuite la fenêtre comme suit :

- 1) cocher le sous-projet
- 2) cocher le bouton pour “Générer les planches”, reporter les dates de début et fin de la phase, puis cocher “Multiple” et fixer l’interval à 1 semaine
- 3) choisir le plan et le gabarit par défaut pour les planches
- 4) choisir un prototype d’étiquette et spécifiez si besoin la couleur et le style des liens d’étiquettes
- 5) cliquer sur “Remplacer”
- 6) pour chaque phase, ajuster au besoin le plan utilisé

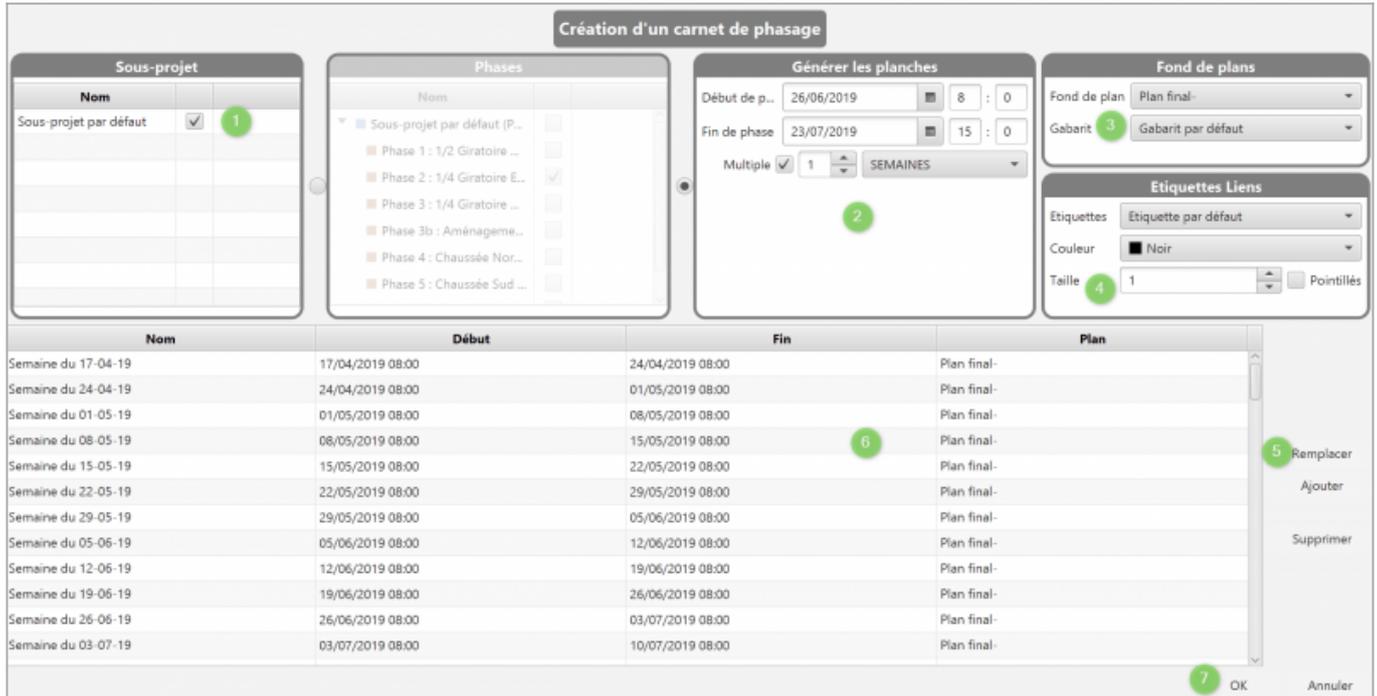

Nom	Début	Fin	Plan
Semaine du 17-04-19	17/04/2019 08:00	24/04/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 24-04-19	24/04/2019 08:00	01/05/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 01-05-19	01/05/2019 08:00	08/05/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 08-05-19	08/05/2019 08:00	15/05/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 15-05-19	15/05/2019 08:00	22/05/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 22-05-19	22/05/2019 08:00	29/05/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 29-05-19	29/05/2019 08:00	05/06/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 05-06-19	05/06/2019 08:00	12/06/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 12-06-19	12/06/2019 08:00	19/06/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 19-06-19	19/06/2019 08:00	26/06/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 26-06-19	26/06/2019 08:00	03/07/2019 08:00	Plan final-
Semaine du 03-07-19	03/07/2019 08:00	10/07/2019 08:00	Plan final-

- 7) “OK” permet de créer le carnet.

Optionnellement :

Il est possible d’ajouter différents séquences à la suite les unes des autres. Pour cela, procéder comme ci-dessus, mais avant de cliquer sur “Appliquer”, choisir de nouveaux paramètres et cliquer sur “Ajouter”. Quand tout est ajouté, cliquer sur “Appliquer”.

Notes :

- Pour supprimer une planche : la mettre en surbrillance puis cliquer sur “Supprimer”
- La position des planches peut être modifiée en faisant du drag&drop
